



伊那新校（仮称）建設工事（第一期） 5月度工事月次報告書

Yamaura

Schedule

工種 / 月	2026年												2027年											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
基礎工事																								
外構工事																								
木工事																								
屋根・外壁工事																								
内装工事																								
合宿所改修																								
部室・渡り廊下																								

伊那新校（仮称）建設工事（第一期）が、いよいよ着工しました。

去る4月15日（大安）、小体育館、プール等の解体跡地にて、安全祈願祭を執り行い、建物を支える杭工事に着手いたしました。


杭は10m以上の長さを確保し、強固な地盤まで到達させております。

5月は基礎下の杭工事が終了し、6月は基礎コンクリート工事に入ります。

皆様におかれましては、本工事へのご理解とご協力を賜り、大変感謝申し上げます。

引き続きご不便、ご迷惑をお掛けしますが、安全第一に細心の注意を払って工事を進めてまいります。

今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

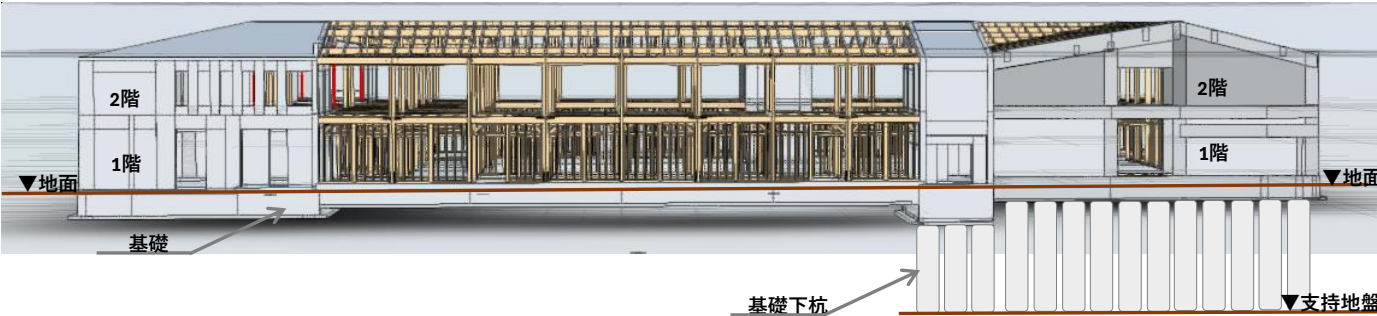

新校舎のポイント

- 山並みの風景と調和し、生徒たちの活動を支える大屋根
- 鳥や虫、植物も生息でき、自然と共生できる社会を目指す
- これからの子どもたちが、地域の自然の豊かさを感じられる屋外空間
- 校舎の大部分を地域の木を多用した木造建築とし、CO₂を固定化
- 環境と地域経済の循環モデルとなる
- 上伊那共創コンソーシアムの活動が円滑に進むように、来客は学校に来やすく、学校は受け入れやすい機能配置
- 生徒の多様な学びをおおらかに受け入れ、多様な活動を展開しやすい内部空間
- 全ての学びの礎となる学力を支える充実した講義室と特別教室





2026.04.01～2026.05.31 工事進捗 時系列 写真状況




4月15日（大安）に安全祈願祭・起工式を執行し、工事着手を致しました。▼



▲基礎下の地盤改良着手に合わせて、工事関係者一同で塩・米・酒を撒いて地を清め、工事着手致しました。



学校への振動・騒音を抑制しながら工事を進めています。
現場事務所内では、リアルタイムで学校への騒音振動測定数値を確認して、異常が無いよう管理しています。
北校舎3階廊下には石膏ボードを貼り、防音効果を高めています。
また工事が近接する、北校舎1階美術室前は、防音シートで囲いをして防音対策を行っています。▼



工事車両進入路徐行注意喚起看板。市道への警備員配置による工事車両誘導。▶
▼トラックスケールによる積載重量の確認。過積載の防止。



低騒音タイプの掘削用バックホーを使用して、騒音振動に配慮しています。騒音振動計によりリアルタイムに監視して管理しています。▶
▼



北校舎北側のグラウンドをサッカー練習場として整備しました。▶



工事前

工事完了
