伊那新校（仮称）建設工事（第一期）　8月度工事月次報告書

◆設計・工事監理　暮らしと建築社・みかんぐみ共同企業体　◆建築工事　㈱ヤマウラ　◆電力・弱電設備工事　㈱林電機　◆空調・衛生設備工事　㈱シノダ設備

Schedule

工種 ／ 月	2026年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2027年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基礎工事																					
外構工事																					
木工事																					
屋根・外壁工事																					
内装工事																					
合宿所改修																					
部室・渡り廊下																					

伊那新校（仮称）建設工事（第一期）コア部分の1階層組立てを行っています。

西棟は鉄筋コンクリート造と木造の混合構造となります。建物の角及び中間部分に鉄筋コンクリートのコアがあり、コアを繋ぐように木造が組立てられます。
8月は南東側、南西側コアの1階部分から鉄筋、型枠の組立てを始めています。今後は各コア部分のコンクリート打設を行います。コンクリート打設時にはミキサー車の往来が多くなります。
引き続き、市道二条線上での交通誘導と徐行運転を徹底し、安全確保に努めていきます。
皆様におかれましては、本工事へのご理解とご協力を賜り、大変感謝申し上げます。
引き続きご不便、ご迷惑をお掛けしますが、安全第一に細心の注意を払って工事を進めてまいります。
今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

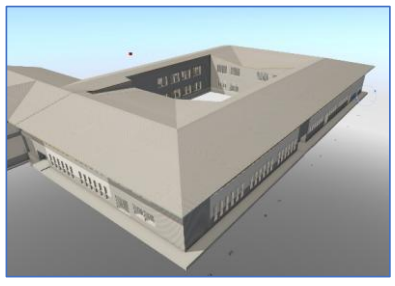

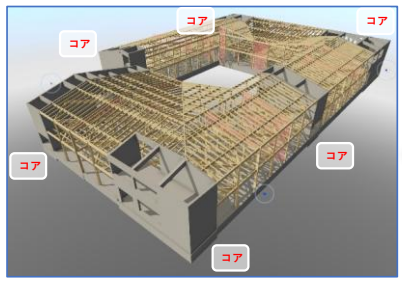

西棟新築イメージ図
北東側より鳥瞰

2026.08.31　北東側より鳥瞰
基礎～土間配筋～1階壁配筋・型枠実施状況

2026.08.03　壁配筋施工状況

2026.08.20　壁型枠施工状況

2026.08.31　2階床型枠施工状況

2026.08.01～2026.08.31　工事進捗　時系列　写真状況

写真①

写真②

写真③

写真④

▲　基礎コンクリート打設～埋戻し～砕石敷き～1階床配筋状況です。

写真①　基礎コンクリート打設後、型枠を解体。基礎の出来形寸法確認を行います。

写真②　基礎のマスの中に土を埋め、沈下しないよう充填転圧を行います。

写真③　配筋を行う下地は砕石を敷き、防湿シートを設置した後に配筋を行います。

写真④　1階の床下地となる部分の配筋を行ったのちに、コンクリート打設を行います。

▲ 土間配筋後には設計事務所監理者、長野県施設課監督員立会いのもと、検査を行っています。検査合格後にコンクリート打設を行います。コンクリート打設後は、左官職人が機械コテを使用して押さえ込みを行うことで、平滑な仕上げになります。

▲

南東部コア、内部階段となる部分です。

木造との接続部分は、壁に接続用のアンカーボルトを設置した後にコンクリート打設を行います。

▲

35℃以上の猛暑日が続きます。現場では様々な熱中症対策を行いながら安全に工事を進めています。

►　井戸の掘削状況です。地下80mまで井戸水を汲み上げるための孔を掘っています。
